

Materialerfassungsliste für FASTLOCK Multi Lichtplattendächer + Zubehör, jedoch ohne Unterkonstruktion


BVH:
.....

Datum:
Sachbearbeiter:

Unterkonstruktion längsverlegt: Die Auflagefläche der Unterkonstruktion (Sparren od. glw.) muss bei der Längsverlegung mittig im Plattenstoß angeordnet sein.

Bei allen übrigen Unterkonstruktionen ist eine querverlegte Tragkonstruktion erforderlich.


Neigung (ab 3 cm/m) : cm/m

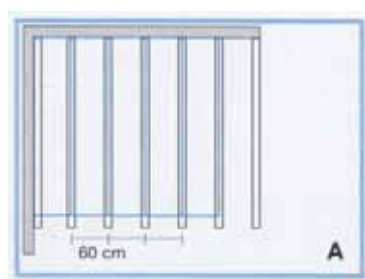

Länge L = m

Gefälle in Längsrichtung

← B = m (Längsverlegung) →

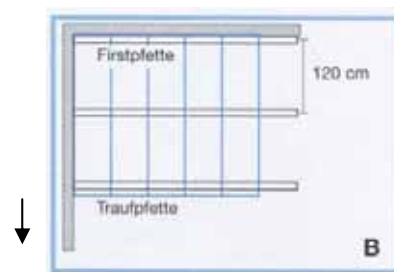

← B = m (Querverlegung) →

Längen in Meter einsetzen !



Paneelanzahl: $B / 0,6 = \dots\dots / 0,6 = \dots\dots$ Stk. Paneele

Latten- / Pfettenanzahl bzw. Befestigungspunkte pro Sparren

U-Konstr. / Befestigungspkte $(L / 1,2) + 1 = (\dots\dots / 1,2) + 1 = \dots\dots$

Aufgerundet auf ganze Zahl = Stk.

Multi-Alu-Befestiger zur Befestigung

Paneelanzahl x Latten bzw. Befestigungspunkte/Sparren = x = Stk.

Best.Nr. 346040; a' 10 Stk **Beutel Multi-Alu-Befestiger**








Multi-Schutzstopfen

Anzahl der Paneele = Stk. Multi Stopfen

Best.Nr. 346050; a' 10 Stk **Beutel Multi Stopfen**

Materialerfassungsliste für die Anschlussdetails entsprechend dem Fastlock Multi-Prospekt



| L bzw. B in die Tabelle einsetzen | Länge L = m; 2 x L = m | | | | Breite B = m | | | | | | | | |
|--|---|---|---|---|--|---|---|--|-----------------|-----------------|---------------------------------|--|--|
| |  |  |  |  |  |  |  | | | | | | |
| Ausführungsdetail | H1 | H2 | H3 | H4 | H5 | H6 | H7 | Anzahl der Längen L und Breiten B | Summe in [m] | Stück- länge | VE bzw. Stück / Beutel | erforderliche Anzahl von VE, aufgerundet auf ganze Zahl | |
| Zubehör | seitl. Wand- anschluss | seitl. Ortgang- anschluss | seitl. Wand- anschluss mit ver- schmälertem Paneel | seitl. Ortgang mit ver- schmälertem Paneel | First bei Steildach | oberer stirns. Wand- anschluss | Traufe | | | | | | |
| Wandanschlussprofil | | - | | - | - | | - | | | / 0,98m | 1 | | |
| Winkelseitenbeschlag | | - | - | - | - | - | - | | | / 0,6 m | / 10 | | |
| Fugendichtung | | - | | - | - | - | - | | | / 1,0 m | 1 | | |
| Seitendichtung | | | | | - | - | - | | | / 6,0 m | 1 | | |
| Ortgangprofil | - | | - | | - | - | - | | | / 0,98 m | 1 | | |
| Seitenbeschlag | - | | - | - | - | - | - | | | / 0,6 m | / 10 | | |
| Seitenschiene | - | - | | | - | - | - | | | / 3,0 m | 1 | | |
| Befestiger (sind bei Seitenschiene dabei) | - | - | | | - | - | - | | | / 0,6 m | 1 | | |
| Firstprofil | - | - | - | - | 1x | - | - | | | / 1,15 m | 1 | | |
| 3 Schrauben / Firstprofil (sind bei Firstprofil dabei) | - | - | - | - | 1x | - | - | | | / 0,38 m | 1 | | |
| Oberdichtung | - | - | - | - | 2x | | - | | | / 1,2 m | 1 | | |
| Firstschiene | - | - | - | - | 2x | | - | | | / 0,6 m | 1 | | |
| Unterdichtung | - | - | - | - | 2x | | | | | / 1,2 m | / 4 | | |
| Traufschiene | - | - | - | - | - | - | | | | / 3,0 m | 1 | | |
| Alu-Filtertape | ist erforderlich, wenn Paneele in der Länge gekürzt werden, ansonst nicht | | | | | | | 1 x B | B | | / 10,0 m | 1 | |

Bestellung Fastlock Multi - Stand



BVH:

Datum:
 Sachbearbeiter:

| n Stk. | n x L x b [m2] b = 0,622 m | | € | | € |
|-----------|----------------------------------|--|---|--|---|
| | | Fastlock UNI Einschicht-Paneel TRANSPARENT, L = m | | /m ² Verrechnungsbreite b = 0,622 m | |
| | | Fastlock UNI Einschicht-Paneel WEISS, L = m | | /m ² Verrechnungsbreite b = 0,622 m | |
| | | Oberdichtung 1,2 m | | /Stk. | |
| | | Unterdichtung 4 x 1,2 m = 4,8 m | | /Beutel (a' 4 Stk.) | |
| | | Seitendichtung 6,0 m | | /Rolle | |
| | | Fugendichtung 1,0 m | | /Stk. | |
| | | Ortgangprofil 1,0 m | | /Stk. | |
| | | Wandanschlussprofil 1,00m | | Stk. | |
| | | Firstprofil 20° ; 1,25 m | | /Stk. | |
| | | 3 Schrauben pro Firstprofil (sind bei Firstprofil inkludiert) | | - | - |
| | | Alu-Filtertape 10 m | | /Rolle | |
| | | Traufschiene 3,0 m | | /Stk. | |
| | | Seitenschiene 3,0 m | | /Stk. | |
| | | 5 Befestiger / Seitenschiene (sind bei Seitenschiene inkludiert) | | - | - |
| | | Firstschiene 0,595 m | | /Stk. | |
| | | Multi-Schutzstopfen mit Schaumstoff-Einlage | | /Beutel (a' 10 Stk.) | |
| | | Multi-Alu-Befestiger | | /Beutel (a' 10 Stk.) | |
| | | Seitenbeschlag | | /Beutel (a' 10 Stk.) | |
| | | Winkelseitenbeschlag | | /Beutel (a' 10 Stk.) | |
| | | Lochzange | | /Stk. | |
| | | | | Zwischensumme | |
| | | Frachtkostenpauschale für Längen über 6 m | | Pauschal einmalig netto / netto | |
| | | | | Gesamtsumme | |
